


Mängelliste

BAUSTELLE	Îlot Cassiopée, 42 quai de la Fonderie, 44200 Nantes
ÜBERGABE	2026-09-14
GEPRÜFT VON	M. Ravel, Y. Sombath
REFERENZ	RS-2026-0914-03

Das Geschoss, und wo jeder Mangel liegt — Maßstab 1:300 — 48.0 m × 26.0 m

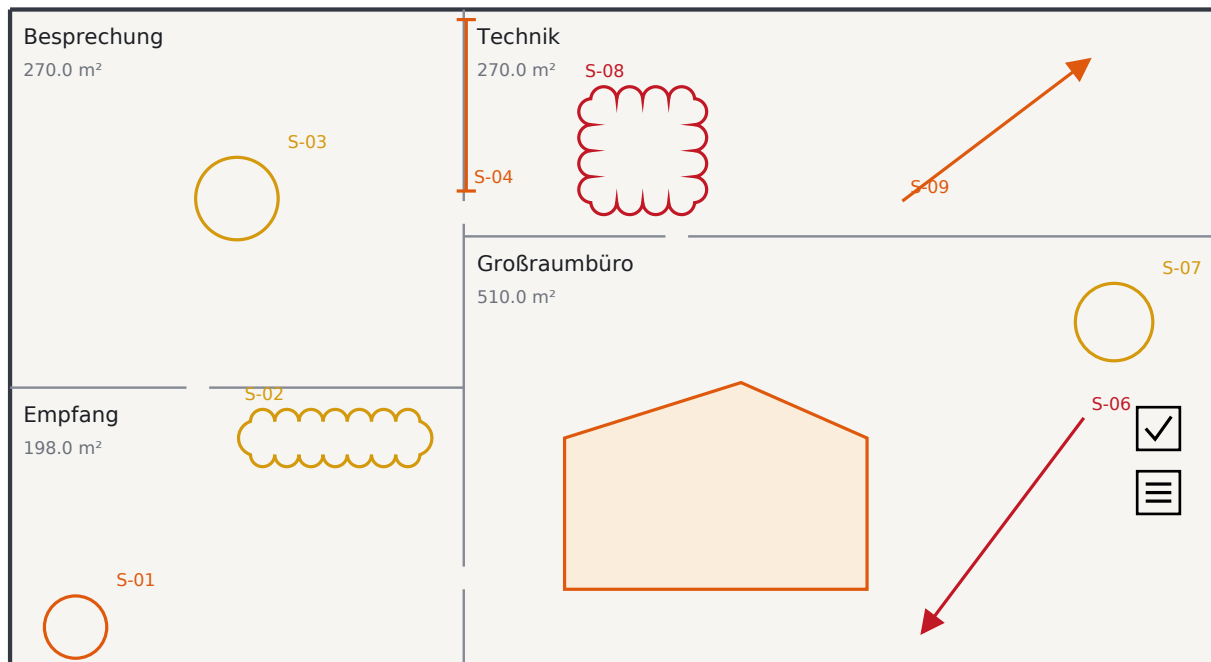

Was jede Markierung bedeutet

Wolke — die ganze umrandete Fläche steht unter Vorbehalt.

Kreis — ein Mangel an einem Punkt.

Pfeil — die Spitze zeigt auf das, worum es in der Notiz geht.

Umriss — ein Mangel, der sich über eine eigene Fläche erstreckt.

Linienzug — ein Mangel entlang einer Linie, eines Risses, einer Fuge oder einer Sockelleiste.

Was jede Farbe bedeutet

- Sperrend — binnen 7 Tagen nach der Übergabe zu beheben
- Erheblich — binnen 21 Tagen nach der Übergabe zu beheben
- Gering — binnen 30 Tagen nach der Übergabe zu beheben

Jede Markierung im Plan sagt dieselben Worte wie ihre Zeile in der Liste.

Eine Lesesoftware zeigt sie, verbirgt sie oder lässt sie auf dem Papier weg.

Die Mängel, einer je Zeile

NR.	RAUM	BEFUND	GRAD	BEHEBEN BIS	GEWERK
S-01	Empfang	Eingangstür schleift am Boden	Erheblich	2026-10-05	Tischler
S-02	Empfang	Farbläufer an Endtrennwand	Gering	2026-10-14	Maler
S-03	Besprechung	Deckenplatte über Tisch gerissen	Gering	2026-10-14	Putz
S-04	Besprechung	Glastrennwand zerkratzt	Erheblich	2026-10-05	Verglasung
S-05	Großraumbüro	Bodenbelag hebt sich an Fugen	Erheblich	2026-10-05	Bodenbelag
S-06	Großraumbüro	Drei Steckdosen Süd ohne Strom	Sperrend	2026-09-21	Elektro
S-07	Großraumbüro	Leuchte über Kopierer fehlt	Gering	2026-10-14	Elektro
S-08	Technik	Wasser am Fuß des Schachts	Sperrend	2026-09-21	Sanitär
S-09	Technik	Abluftgitter nicht angeschlossen	Erheblich	2026-10-05	Lüftung

SUMME — 9

Jede Markierung im Plan sagt dieselben Worte wie ihre Zeile in der Liste.

Eine Lesesoftware zeigt sie, verbirgt sie oder lässt sie auf dem Papier weg.

Was die Mängel ergeben

Nach Grad

GRAD	MÄNGEL	ANTEIL
■ Sperrend	2	22.2 %
■ Erheblich	4	44.4 %
■ Gering	3	33.3 %
SUMME	9	

Nach Raum

RAUM	BEREICH	MÄNGEL	ANTEIL
Empfang	198.0 m ²	2	22.2 %
Besprechung	270.0 m ²	2	22.2 %
Großraumbüro	510.0 m ²	3	33.3 %
Technik	270.0 m ²	2	22.2 %
SUMME	1 248.0 m ²	9	

Nach Gewerk

GEWERK	MÄNGEL	ANTEIL
Tischler	1	11.1 %
Maler	1	11.1 %
Putz	1	11.1 %
Verglasung	1	11.1 %
Bodenbelag	1	11.1 %
Elektro	2	22.2 %
Sanitär	1	11.1 %
Lüftung	1	11.1 %
SUMME	9	

Der letzte der Termine, bis zu denen die Mängel zu beheben sind

2026-10-14
