


Lista de reservas

OBRA	Îlot Cassiopée, 42 quai de la Fonderie, 44200 Nantes
ENTREGA	2026-09-14
INSPECCIONADO POR	M. Ravel, Y. Sombath
REFERENCIA	RS-2026-0914-03

La planta, y dónde está cada reserva — Escala 1:300 — 48.0 m × 26.0 m

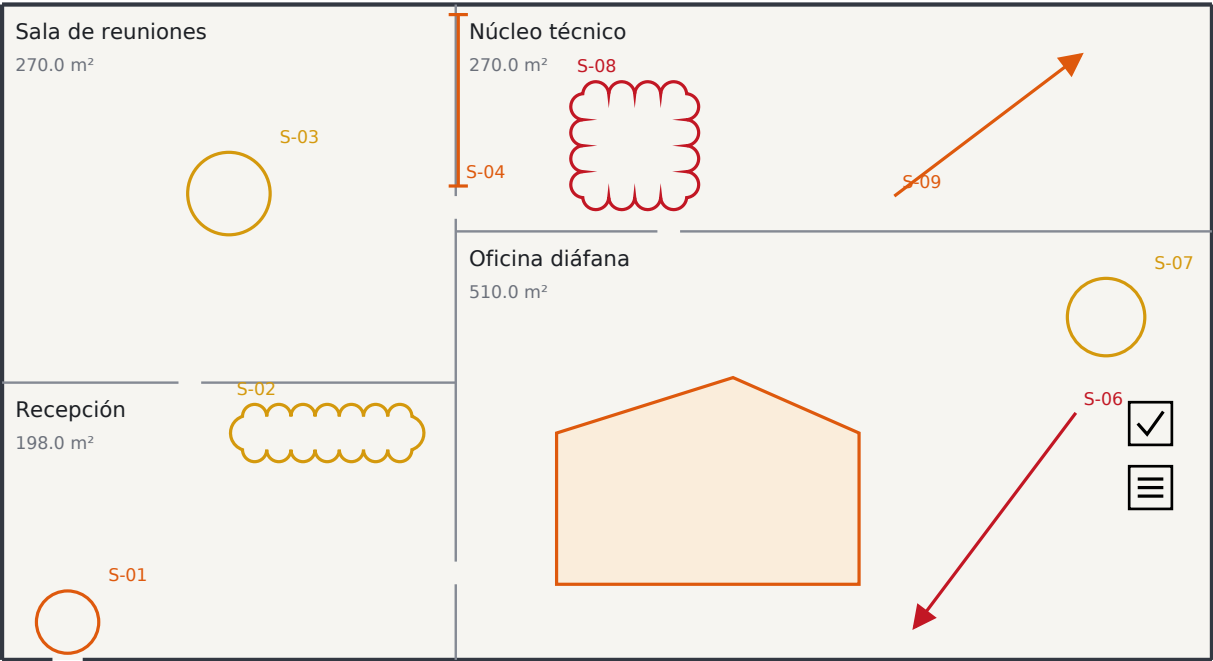

Qué significa cada marca

- Nube: todo el recinto que rodea está bajo reserva.
- Anillo: un defecto situado en un punto.
- Flecha: la punta señala aquello de lo que habla la nota.
- Contorno: un defecto que se extiende por una zona propia.
- Recorrido: un defecto que sigue una línea, una grieta, una junta o un rodapié.

Qué significa cada color

- Bloqueante — subsanado en los 7 días siguientes a la entrega
- Grave — subsanado en los 21 días siguientes a la entrega
- Leve — subsanado en los 30 días siguientes a la entrega

Cada marca del plano dice lo mismo que su línea de la lista.
El programa de lectura las muestra, las oculta o las deja fuera del papel.

Las reservas, una por línea

N.º	ESTANCIA	QUÉ SE ENCONTRÓ	GRADO	FECHA LÍMITE	GREMIO
S-01	Recepción	La puerta de entrada roza el suelo	Grave	2026-10-05	Carpintería
S-02	Recepción	Chorretones en el tabique del fondo	Leve	2026-10-14	Pintura
S-03	Sala de reuniones	Placa de techo rajada sobre la mesa	Leve	2026-10-14	Yesería
S-04	Sala de reuniones	Mampara acristalada rayada	Grave	2026-10-05	Acristalamiento
S-05	Oficina diáfana	Suelo levantado en las juntas	Grave	2026-10-05	Suelo
S-06	Oficina diáfana	Tres enchufes sin corriente (sur)	Bloqueante	2026-09-21	Electricidad
S-07	Oficina diáfana	Sin lámpara sobre la fotocopidora	Leve	2026-10-14	Electricidad
S-08	Núcleo técnico	Agua al pie del montante	Bloqueante	2026-09-21	Fontanería
S-09	Núcleo técnico	Rejilla de extracción sin conectar	Grave	2026-10-05	Climatización

TOTAL — 9

Cada marca del plano dice lo mismo que su línea de la lista.
El programa de lectura las muestra, las oculta o las deja fuera del papel.

Lo que suman las reservas

Agrupadas por grado

GRADO	RESERVAS	PARTE
Bloqueante	2	22.2 %
Grave	4	44.4 %
Leve	3	33.3 %
TOTAL	9	

Agrupadas por estancia

ESTANCIA	ZONA	RESERVAS	PARTE
Recepción	198.0 m²	2	22.2 %
Sala de reuniones	270.0 m²	2	22.2 %
Oficina diáfana	510.0 m²	3	33.3 %
Núcleo técnico	270.0 m²	2	22.2 %
TOTAL	1 248.0 m²	9	

Agrupadas por gremio

GREMIO	RESERVAS	PARTE
Carpintería	1	11.1 %
Pintura	1	11.1 %
Yesería	1	11.1 %
Acristalamiento	1	11.1 %
Suelo	1	11.1 %
Electricidad	2	22.2 %
Fontanería	1	11.1 %
Climatización	1	11.1 %
TOTAL	9	

La última de las fechas en que debe subsanarse el trabajo	2026-10-14
---	------------
