


Opleverlijst

LOCATIE	Îlot Cassiopée, 42 quai de la Fonderie, 44200 Nantes
OPEVERING	2026-09-14
GEÏNPECTEERD DOOR	M. Ravel, Y. Sombath
REFERENTIE	RS-2026-0914-03

De verdieping, en waar elk gebrek zit — Schaal 1:300 — 48.0 m × 26.0 m

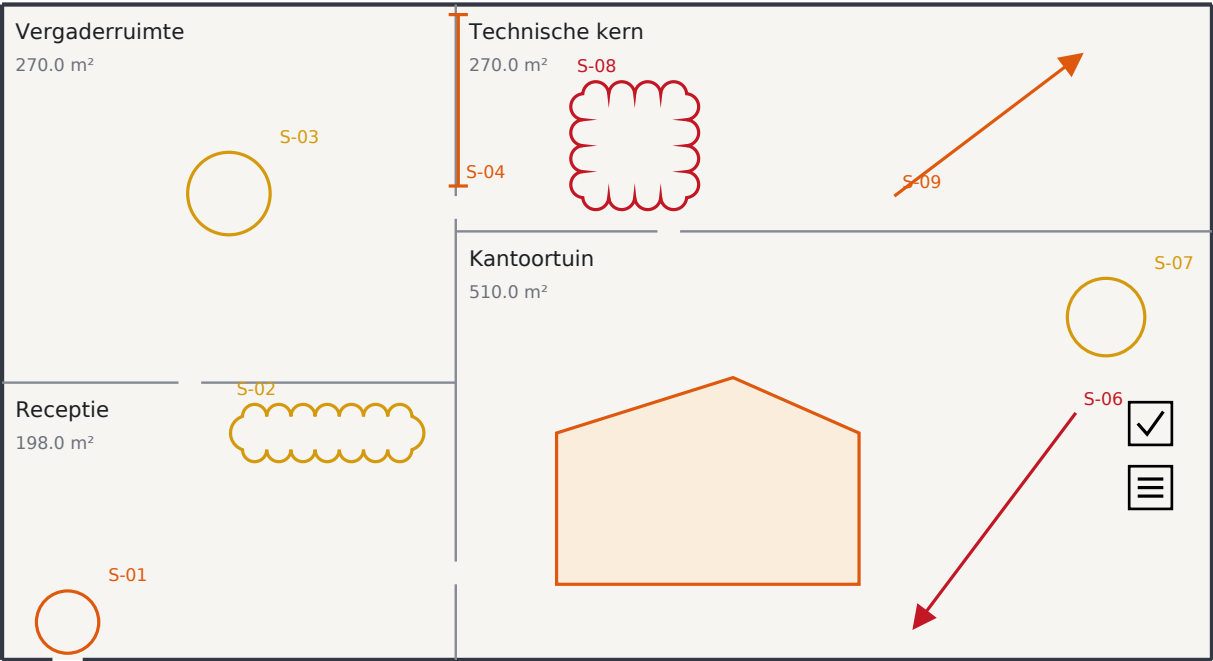

Wat elke markering betekent

- Wolk: het hele vlak dat ze omsluit, staat onder voorbehoud.
- Ring: een gebrek op één punt.
- Pijl: de punt wijst naar waar de notitie over gaat.
- Omtrek: een gebrek dat zich over een eigen vlak uitstrekt.
- Lijn: een gebrek dat een lijn volgt, een scheur, een voeg of een plint.

Wat elke kleur betekent

- Blokkerend — hersteld binnen 7 dagen na oplevering
- Groot — hersteld binnen 21 dagen na oplevering
- Klein — hersteld binnen 30 dagen na oplevering

Elke markering op de plattegrond zegt dezelfde woorden als haar regel in de lijst.
Leessoftware toont ze, verbergt ze of laat ze van het papier weg.

De gebreken, één per regel

NR.	RUIMTE	WAT ER GEVONDEN IS	ERNST	GEREED OP	VAKGEBIED
S-01	Receptie	Toegangsdeur sleept over de vloer	Groot	2026-10-05	Timmerwerk
S-02	Receptie	Verflopers op de achterwand	Klein	2026-10-14	Schilderwerk
S-03	Vergaderruimte	Plafondplaat gebarsten boven tafel	Klein	2026-10-14	Stucwerk
S-04	Vergaderruimte	Glazen wand bekrast	Groot	2026-10-05	Beglazing
S-05	Kantoortuin	Vloer komt los bij de naden	Groot	2026-10-05	Vloerbedekking
S-06	Kantoortuin	Drie stopcontacten zonder stroom	Blokkerend	2026-09-21	Elektra
S-07	Kantoortuin	Geen lamp boven de kopieerder	Klein	2026-10-14	Elektra
S-08	Technische kern	Water onder aan de stijgleiding	Blokkerend	2026-09-21	Sanitair
S-09	Technische kern	Afzuigrooster niet aangesloten	Groot	2026-10-05	Ventilatie

TOTAAL — 9

Elke markering op de plattegrond zegt dezelfde woorden als haar regel in de lijst.
Leessoftware toont ze, verbergt ze of laat ze van het papier weg.

Waar de gebreken op neerkomen

Gegroepeerd per ernst

ERNST	GEBREKEN	AANDEEL
 Blokkerend	2	22.2 %
 Groot	4	44.4 %
 Klein	3	33.3 %
TOTAAL	9	

Gegroepeerd per ruimte

RUIMTE	GEBIED	GEBREKEN	AANDEEL
Receptie	198.0 m ²	2	22.2 %
Vergaderruimte	270.0 m ²	2	22.2 %
Kantoortuin	510.0 m ²	3	33.3 %
Technische kern	270.0 m ²	2	22.2 %
TOTAAL	1 248.0 m ²	9	

Gegroepeerd per vakgebied

VAKGEBIED	GEBREKEN	AANDEEL
Timmerwerk	1	11.1 %
Schilderwerk	1	11.1 %
Stucwerk	1	11.1 %
Beglazing	1	11.1 %
Vloerbedekking	1	11.1 %
Elektra	2	22.2 %
Sanitair	1	11.1 %
Ventilatie	1	11.1 %
TOTAAL	9	

De laatste van de data waarop het werk hersteld moet zijn

2026-10-14
