


Elenco delle riserve

CANTIERE	Îlot Cassiopée, 42 quai de la Fonderie, 44200 Nantes
CONSEGNA	2026-09-14
ISPEZIONATO DA	M. Ravel, Y. Sombath
RIFERIMENTO	RS-2026-0914-03

La pianta, e dove sta ogni riserva — Scala 1:300 — 48.0 m × 26.0 m

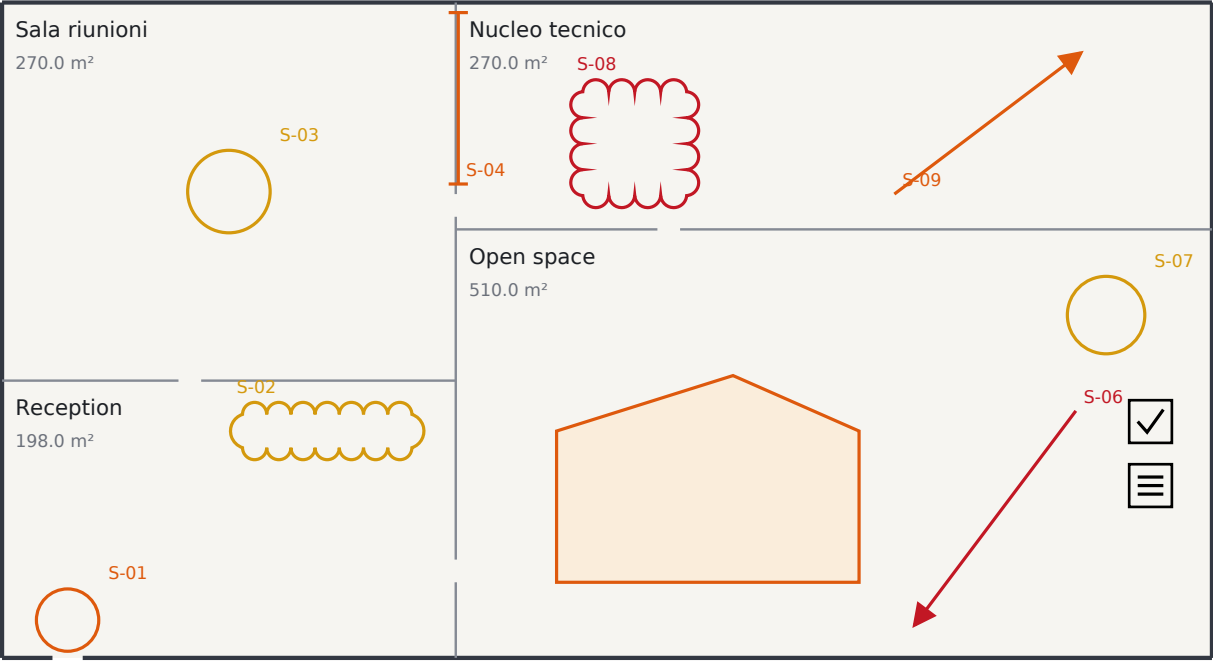

Cosa significa ogni segno

- Nuvola: tutta l'area che circonda è sotto riserva.
- Anello: un difetto in un punto.
- Freccia: la punta indica ciò di cui parla la nota.
- Contorno: un difetto che si estende su un'area propria.
- Percorso: un difetto che segue una linea, una crepa, un giunto o un battiscopa.

Cosa significa ogni colore

- Bloccante — da sistemare entro 7 giorni dalla consegna
- Grave — da sistemare entro 21 giorni dalla consegna
- Lieve — da sistemare entro 30 giorni dalla consegna

Ogni segno sulla pianta dice le stesse parole della sua riga nell'elenco.
Il programma di lettura li mostra, li nasconde o li lascia fuori dalla carta.

Le riserve, una per riga

N.	LOCALE	COSA SI È TROVATO	GRADO	SCADENZA	IMPRESA
S-01	Reception	La porta d'ingresso sfrega a terra	Grave	2026-10-05	Falegnameria
S-02	Reception	Colature sulla parete di fondo	Lieve	2026-10-14	Tinteggiatura
S-03	Sala riunioni	Pannello incrinato sopra il tavolo	Lieve	2026-10-14	Intonaco
S-04	Sala riunioni	Parete vetrata graffiata	Grave	2026-10-05	Vetrate
S-05	Open space	Pavimento che si solleva ai giunti	Grave	2026-10-05	Pavimento
S-06	Open space	Tre prese senza corrente, linea sud	Bloccante	2026-09-21	Elettrico
S-07	Open space	Manca la luce sulla fotocopiatrice	Lieve	2026-10-14	Elettrico
S-08	Nucleo tecnico	Acqua alla base del montante	Bloccante	2026-09-21	Idraulica
S-09	Nucleo tecnico	Griglia di estrazione non collegata	Grave	2026-10-05	Climatizzazione

TOTALE — 9

Ogni segno sulla pianta dice le stesse parole della sua riga nell'elenco.
Il programma di lettura li mostra, li nasconde o li lascia fuori dalla carta.

A cosa ammontano le riserve

Raggruppate per grado

GRADO	RISERVE	QUOTA
 Bloccante	2	22.2 %
 Grave	4	44.4 %
 Lieve	3	33.3 %
TOTALE	9	

Raggruppate per locale

LOCALE	ZONA	RISERVE	QUOTA
Reception	198.0 m ²	2	22.2 %
Sala riunioni	270.0 m ²	2	22.2 %
Open space	510.0 m ²	3	33.3 %
Nucleo tecnico	270.0 m ²	2	22.2 %
TOTALE	1 248.0 m ²	9	

Raggruppate per impresa

IMPRESA	RISERVE	QUOTA
Falegnameria	1	11.1 %
Tinteggiatura	1	11.1 %
Intonaco	1	11.1 %
Vetrate	1	11.1 %
Pavimento	1	11.1 %
Elettrico	2	22.2 %
Idraulica	1	11.1 %
Climatizzazione	1	11.1 %
TOTALE	9	

L'ultima delle date entro cui il lavoro va sistemato

2026-10-14
