


Lista de reservas

OBRA	Îlot Cassiopée, 42 quai de la Fonderie, 44200 Nantes
ENTREGA	2026-09-14
INSPECIONADO POR	M. Ravel, Y. Sombath
REFERÊNCIA	RS-2026-0914-03

O piso, e onde fica cada reserva — Escala 1:300 — 48.0 m × 26.0 m

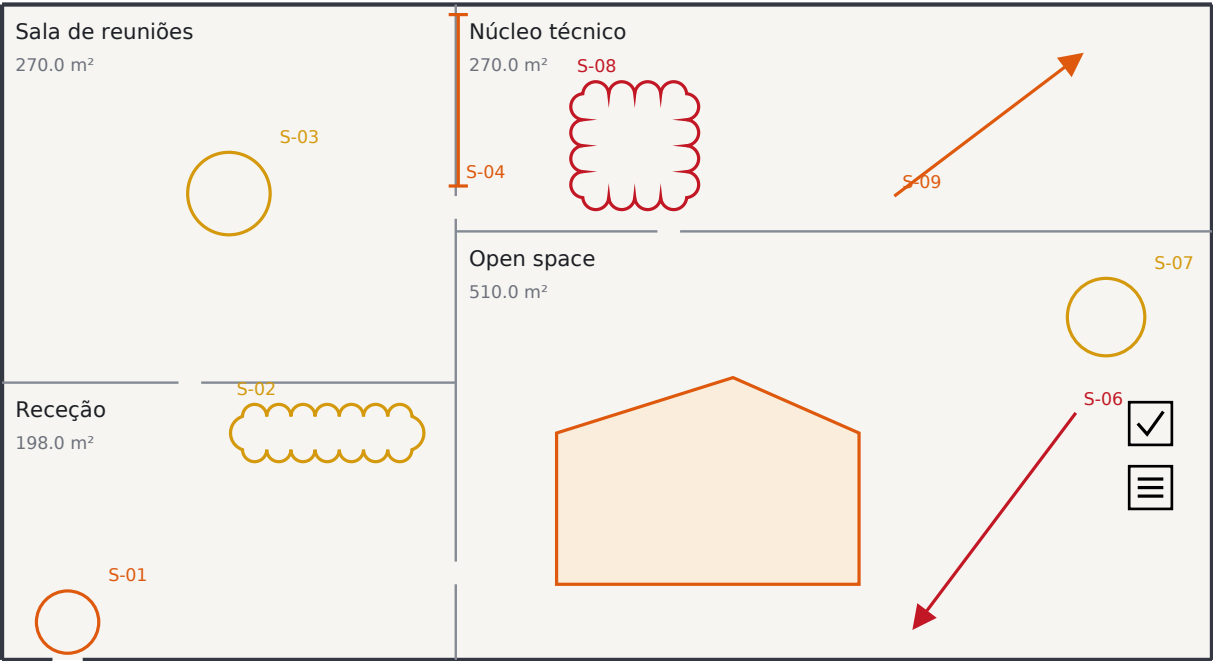

O que significa cada marca

- Nuvem: toda a zona que contorna está sob reserva.
- Anel: um defeito situado num ponto.
- Seta: a ponta assenta naquilo de que a nota fala.
- Contorno: um defeito que se estende por uma zona própria.
- Percurso: um defeito que segue uma linha, uma fissura, uma junta ou um rodapé.

O que significa cada cor

- Bloqueante — corrigido nos 7 dias seguintes à entrega
- Grave — corrigido nos 21 dias seguintes à entrega
- Ligeira — corrigido nos 30 dias seguintes à entrega

Cada marca na planta diz as mesmas palavras que a sua linha na lista.
O programa de leitura mostra-as, oculta-as ou deixa-as fora do papel.

As reservas, uma por linha

N.º	DIVISÃO	O QUE FOI ENCONTRADO	GRAU	CORRIGIR ATÉ	ESPECIALIDADE
S-01	Receção	A porta de entrada roça no chão	Grave	2026-10-05	Carpintaria
S-02	Receção	Escorridos na divisória do fundo	Ligeira	2026-10-14	Pintura
S-03	Sala de reuniões	Placa de teto rachada sobre a mesa	Ligeira	2026-10-14	Estuque
S-04	Sala de reuniões	Divisória envidraçada riscada	Grave	2026-10-05	Vidros
S-05	Open space	Piso a levantar nas juntas	Grave	2026-10-05	Piso
S-06	Open space	Três tomadas sem corrente (sul)	Bloqueante	2026-09-21	Eletricidade
S-07	Open space	Falta a luz sobre a fotocopiadora	Ligeira	2026-10-14	Eletricidade
S-08	Núcleo técnico	Água na base da coluna montante	Bloqueante	2026-09-21	Canalização
S-09	Núcleo técnico	Grelha de extração por ligar	Grave	2026-10-05	Climatização

TOTAL — 9

Cada marca na planta diz as mesmas palavras que a sua linha na lista.
O programa de leitura mostra-as, oculta-as ou deixa-as fora do papel.

A que somam as reservas

Agrupadas por grau

GRAU	RESERVAS	PARTE
Bloqueante	2	22.2 %
Grave	4	44.4 %
Ligeira	3	33.3 %
TOTAL	9	

Agrupadas por divisão

DIVISÃO	ZONA	RESERVAS	PARTE
Receção	198.0 m²	2	22.2 %
Sala de reuniões	270.0 m²	2	22.2 %
Open space	510.0 m²	3	33.3 %
Núcleo técnico	270.0 m²	2	22.2 %
TOTAL	1 248.0 m²	9	

Agrupadas por especialidade

ESPECIALIDADE	RESERVAS	PARTE
Carpintaria	1	11.1 %
Pintura	1	11.1 %
Estuque	1	11.1 %
Vidros	1	11.1 %
Piso	1	11.1 %
Eletricidade	2	22.2 %
Canalização	1	11.1 %
Climatização	1	11.1 %
TOTAL	9	

A última das datas até às quais o trabalho deve ser corrigido

2026-10-14
